

# 安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债项目事中绩效评价

## 绩效评价报告

委托单位：宣州区财政局

承接单位：江苏源合会计师事务所有限公司

二〇二二年六月三十日

## 目录

一、 基本情况 .....	4
(一) 项目概况 .....	4
1. 项目背景 .....	4
2. 项目内容 .....	5
3. 实施情况 .....	6
4. 资金投入及使用情况 .....	7
(二) 项目绩效目标 .....	7
二、 绩效评价工作开展情况 .....	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	8
1. 目的 .....	8
2. 对象及范围 .....	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、 评价方法、评价标准等 .....	9
1. 评价原则 .....	9
2. 评价方法 .....	9
3. 评价标准 .....	9
4. 绩效评价体系 .....	9
5. 绩效评价工作过程 .....	10
三、 综合评价情况及评价结论 .....	11
四、 绩效评价指标分析 .....	13

(一) 项目决策情况 .....	14
(二) 项目管理情况 .....	14
五、 主要经验及做法 .....	15
主要经验及做法 .....	15
六、 下一步改进建议 .....	16
七、 附件 .....	17

# 安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债项目事中 绩效评价

宣州区财政局：

受贵单位的委托，我们按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（皖财债〔2021〕1485号）、《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕84号）、宣州区财政局《关于印发〈宣州区项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法〉的通知》（宣区财债〔2020〕144号）等法规、文件精神，对安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债项目进行了事中绩效评价，评价基准日为2022年4月30日。现评价工作已经结束，报告如下

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景



安徽省港口湾水库灌区工程建设符合《长江流域综合规划》（2012-2030 年）、符合《全国大型水库建设总体安排意见（2013-2015）》、符合《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》、符合《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、符合《安徽生态省建设总体规划纲要》、符合《安徽省“十二五”水利发展改革规划》、符合《安徽省农田水利“最后一公里”专项规划（2018—2022 年）》、符合《宣州区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》等文件精神，并得到了相关县市区和广大人民群众的理解与支持。本期债券项目属于农林水利建设类项目，建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性，符合地方政府专项债券项目的公益性要求。本项目建成后可有效发挥港口湾水库的灌溉供水作用，对合理配置当地水资源、提高灌区粮食产量和农业综合生产能力、改善部分乡镇供水及工业供水的水源条件、促进当地经济社会可持续发展，具有重要意义。

## 2. 项目内容

安徽省港口湾水库灌区工程位于安徽省宣城市水阳江上中游，南至港口湾水库、西抵华阳河、水阳江干流（以西为青弋江灌区），北依南漪湖和飞鲤新河，东达新郎川河，国土面积 1012km<sup>2</sup>，行政区划涉及宣城市所辖的宁国市、宣州区和郎溪县的 19 个乡镇、街道。

工程总投资 31.32 亿元，其中：宣州段投资为 18.43 亿元（中央和省级补助 9.35 亿元，地方政府配套 9.08 亿）。

宣州段工程主要建设内容为：渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道 24 条，总长度 285.65km（改造总干渠 1 条、新建干渠 2 条、续建和改造干渠 4 条、新建支渠 10 条、续建和改造支渠 7 条）。涉及宣州区孙埠、洪林、双桥、沈村、五星、朱桥、黄渡、新田和向阳 9 个乡镇街道。

根据实施方案，本次项目债券融资 50,000.00 万元所发生的本息，将通过本项目的农田灌溉水费收入、乡镇及工业供水水费收入、水库水面发包收入、广告位收入、旅游收入分成、砂石收入和财政补助等予以偿还。项目可实现自求平衡。

### 3. 实施情况

1、工程情况。目前，宣州区已完成工程招投标 8 个标段：佟李干渠 1#隧洞工程（施工 1 标）；佟公坝新河口坝新坝工程（施工 5 标）；塘埂头水库总干渠（施工 8 标）；佟总、佟东干渠工程（施工 9 标）；新建石壁山干支渠（施工 11 标）；佟李干渠洪林段（施工 13 标）；佟李干渠孙埠段（施工 14 标）；佟西干渠更新改造（施工 15 标）。截止目前，工程招标合同总价为 59885 万元。

2、征迁情况。截止目前，宣州区收到上级部门下拨的征迁资金 24219 万元。宣州区共拨付 9156 万元，其中分别拨付给孙埠镇



4810 万元，洪林镇 3260 万元，沈村镇 400 万元，黄渡乡 660 万元，新田镇 26 万元。2021 年共拨付 4276 万到乡镇，其中孙埠 1800 万，新田 26 万，黄渡 590 万，沈村 400 万，洪林 1460 万。完成永久征地面积 904.05 亩。

3、田间工程。截止 2021 年底，已完成五星、朱桥等 6 个乡镇田间工程投资 10932.83 万元(宣州区需完成投资 16540 万元)。

#### 4. 资金投入及使用情况

该工程宣州区段总投资为 18.43 亿元(中央和省级补助 9.35 亿元，地方政府配套 9.08 亿)。

截止评价基准日 2022 年 4 月 30 日，已完成工程投资 46900 万元。

工程专项债于 2020 年 7 月申报入库，拟发行总额 5 亿元。其中 2021 年发行 7000 万，已作为区级配套拨付至建设单位安徽省港口湾水库灌区管理局。

### (二) 项目绩效目标

1、总体目标：渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道 24 条，总长度 285.65km(改造总干渠 1 条、新建干渠 2 条、续建和改造干渠 4 条、新建支渠 10 条、续建和改造支渠 7 条)。

2、近期目标：完成与计划投资相匹配的工程量。

本项目建成后可有效发挥港口湾水库的灌溉供水作用，对合

理配置当地水资源、提高灌区粮食产量和农业综合生产能力、改善部分乡镇供水水源条件、促进当地经济社会可持续发展，具有重要意义，具有显著的社会效益、经济效益及生态效益。工程实施后，可减免洪灾损失、增加的土地开发利用价值，带来的防洪效益显著。项目实施后可提高地面林草覆盖度，改善贴地层的温度、湿度和风力；随着植被覆盖度的提高和植物种类的多样化，还可以促进野生动物繁殖。林草地具有涵水、固土、造氧、生产林木蓄积及减少土壤肥力损失等能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 目的

通过第三方开展的绩效评价，加强专项资金管理，客观、公正的检查 2021 年地方政府债券新增债券资金项目绩效目标实现程度，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响，及时总结经验，分析县级预算支出项目在决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议。

#### 2. 对象及范围

本次绩效评价对象为安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债项目涉及资金 7000 万元。范围包括项目：1、决策（项目立项、绩效目标、资金投入），2、管理（预算管理、资金管理、资产管理、组织实施）。



## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 评价原则

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2. 评价方法

根据前期调研资料，本项目评价对象为安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债事中绩效评价，因此本项目采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法。

### 3. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### 4. 绩效评价体系

根据《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（皖财债〔2021〕1485号）文件要求，结合本项目特点共设置了2项一级指标，7个二级指标，10个三级指标对2021年宣州区公开发行人工政府债券新增债券资金项目进行评价；评价体系涵盖项目决策、过程两个方面，采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定4个评价等级。优（成效显著）：评价得分高于90分（含）；良（成效明显）：评价得分在80（含）-90分；中（成效一般）：评价得分在60（含）-80分；差（成效较差）：评价得分在60分以下。

## 5. 绩效评价工作过程

### （1）评价人员组成

江苏源合会计师事务所有限公司委派具有丰富财政支出绩效评价工作经验的徐明担任项目负责人，同时抽调具有绩效评价工作经验的司法鉴定人、造价师、会计师等共5名专业人员组成评价工作组，负责本次绩效评价工作，以确保绩效评价工作客观、公正、严谨。评价人员组成名单详见下表：

姓名	执业资格或职称	备注
徐明	绩效评价师	
唐婷	会计师	
陈洪	会计师	

魏书星	二级造价师	
王尤优	司法鉴定人	

## (2) 绩效评价过程

### 1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、设计资料清单、评价方案论证与沟通等流程。

### 2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题等过程，最后在广泛征求意见的基础上、经三级复核后提交经委托人确认的评价报告。

## 三、评价情况及结论

根据 2021 年宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金项目工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。2021 年宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金暨安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债项目，综合评价得分 100 分，绩效级别为“优”。




绩效评价得分表			
一级指标	二级指标	三级指标	最终得分
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	5
		立项程序规范性 (5')	5
	绩效目标 (10')	绩效目标合理性 (5')	5
		绩效指标明确性 (5')	5
	资金投入 (10')	申请额度与需要的匹配度	10
管理 (70')	预算管理 (8')	预算覆盖率	8
	资金管理 (30')	资金使用合规性 (20')	20
		资金支出进度 (10')	5
			5
	安全管理 (10')	安全管理合规性	10
	组织实施 (22')	项目实施规范性	22
合计			100

评价得分为 100 分、绩效级别为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金暨安徽省港口湾灌区宣州段工程项目，综合评价一级指标得分见下图、二级指标得分见下表：

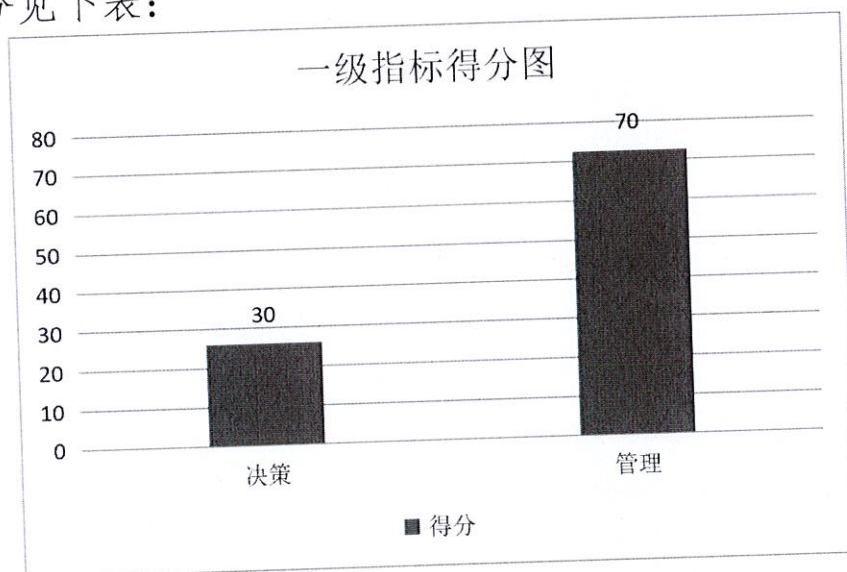

二级指标得分表		
一级指标	二级指标	最终得分
决策 (30')	项目立项 (10')	10
	绩效目标 (10')	10
	资金投入 (10')	10
管理 (70')	预算管理 (8')	8
	资金管理 (30')	30
	安全管理 (10')	10

	组织实施 (22')	22
合计		100

### (一) 项目决策情况

决策方面满分 30 分，评价得分 30 分。

1、其中项目立项满分 10 分，评价得分 10 分。项目立项程序规范，项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标满分 10 分，评价得分 10 分。制定绩效目标，其工作任务目标设定的合理、明确。

3、资金投入满分 10 分，评价得分 10 分。申请使用债券资金与项目性质、内容合规、匹配。

### (二) 项目管理情况

管理方面满分 70 分，评价得分 70 分。

1、其中预算管理满分 8 分，评价得分 8 分，项目资金全额覆盖整个项目，专项债券支出全部纳入政府性基金预算管理，覆盖率为 100%。

2、资金管理方面满分 30 分，评价得分 30 分。其中资金使用合规性满分为 20 分，评价得分 20 分，在项目过程中符合国家财务管理制度及专项资金管理文件规定，有完整的审批过程及手续，符合专项债的投向规定，未发现截留、挪用、挤占等情况。资金支出进度方面满分为 10 分，评价得分 10 分，资金支出进度



100%。安全管理方面满分 10 分，评价得分为 10 分。符合施工现场安全、疫情防控等相关要求。

3、组织实施方面满分 22 分，评价得分 22 分。财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209 号）规定，应当及时规范披露专项债券及其项目信息。

## 五、主要经验及做法

### 主要经验及做法

1、立项选题精准是专项债项目顺利通过的关键。该项目是宣州区水利局所进行的安徽省港口湾水库灌区（宣州区）工程的建设，该项目已列入 2020 年前建设的 172 项重大水利工程，是一项重大民生项目。开展港口湾水库灌区工程，对于从根本上解决当地旱灾、防洪减灾、保障粮食生产、加快地区经济社会发展、保障地区经济社会可持续发展有着重要的意义。满足了符合国家产业政策、符合专项债发行条件，且能自求平衡。本项目属于安徽省财政厅 2020 年重点支持的农林水利公益性建设项目，具有显著的社会公益性，因此能顺利通过省市级评审。

2、领导重视、部门联动是项目通过的保障。该项目从申报伊始，就得到了宣城市领导和相关县市区领导的高度重视，以及财政、发改、水利等部门的通力支持，项目单位更是抽集精兵强将，严格按专项债发行的要求积极申报，第三方专业机构选择得当，确保了项目的顺利进行。

3、监管部门严肃依规才能确保项目行稳致远。财政部门严格资金管理、严格审批流程；水利部门严格制定项目实施方案、港口湾水库灌区管理局严格项目招投标各项流程。确保项目能公平公正开展。

4、该项目是港口湾水库灌区的水利整治的大项目，涉及到三个县市区，牵涉面大，工程专业度高，由港口湾水库灌区管理局统筹协调项目的申报、建设符合大型水利项目建设规律，相关县市区水利局按照职责要求做好区域内工作，才确保了整个项目按计划顺利实施。

## 六、下一步改进建议

（一）加大征迁和外部环境协调力度，持续推进项目工程进度；做好与农业农村部门田间工程的对接工作。

（二）做好后续专项债申报使用工作，保障工程顺利进行。

（三）项目资料及时整理归档；随项目进度涉及各方资料归档，由责任方及时统一整理归档资料。

（四）按要求做好债券相关信息发布、信息公开、情况报告，主动接受社会监督。

（五）项目实施后应建立长效管护机制，划定管护范围，做好建后管护工作。

（六）做好灌区受益区的水费收取宣传解释工作，依法做好水费的合理制定和调整，提高水费收取率，确保项目预期收益。

## 七、附件

- 1、地方政府专项债券项目中期绩效评价指标体系
- 2、安徽省港口湾灌区宣州段工程专项债项目中期绩效评价  
评分表
- 3、项目现场照片

江苏源合会计师事务所有限公司

二〇二二年六月三十日





附件一：

地方政府专项债券项目中期绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目立项是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目立项是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (5')	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ③项目立项、可研、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。
	绩效目标 (10')	绩效目标合理性 (5')	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与项目投融资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (5')	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标、任务数或计划数相对应。
	资金投入 (10')	申请额度与需要的匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。

管理 (70')	预算管理 (8')	预算覆盖率	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率 = (纳入政府性基金预算资金管理资金 / 全部应纳入政府性基金预算资金管理资金) × 100%。
	资金管理 (30')	资金使用合规性 (20')	项目资金使用是否按用途使用，是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的文件规定； ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③ 是否符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④ 是否存在截留、挤占、挪用等情况。
		资金支出进度 (10')	资金支出进度情况。	资金支出进度 = (实际支出债券资金 / 项目债券资金总额) × 100%。
	资产管理 (10')	资产管理合规性	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。 项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点：按项目建设进度拨款情况。
	组织实施 (22')	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况及项目年度收支平衡情况等。	评价要点： ① 是否严格按照专项债券本息偿还计划还本付息； ② 项目收入、成本及预期收益是否合理； ③ 项目是否实现年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④ 专项债券期限与项目期限是否匹配。
			项目信息公开、信息系统管理使用等专项债券项目常态化管理情况。	评价要点： ① 是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ② 信息系统管理使用是否规范； ③ 对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④ 其他财务、采购和管理工作是否合法合规。

附件二：

安徽省港口湾灌区宣州段工程项目中期绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价依据	最终得分	备注
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内项目重复。	①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②符合行业发展规划和政策要求； ③与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④属于政府投资项目，符合专项债券支持领域和方向； ⑤未与相关部门同类项目或部门内项目重复。	5	
		立项程序规范性 (5')	项目申请、设立过程是否经过充分论证，符合相关要求，用以反映和考核项目立项程序规范性。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ③项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。	①项目按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ③项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料符合相关要求。	5	
	绩效目标 (10')	绩效目标合理性 (5')	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否与客观实际相符，用以反映和考核项目绩效目标与实施情况的相符性。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常年份的预期水平； ④是否与投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与投资额或资金量相匹配。	5	



	绩效指标明确性 (5')	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标实现情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标或计划数相对应。	5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标或计划数相对应
	资金投入 (10')	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金是否符合规定、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。	10	①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。
	预算管理 (8')	专项债券支出、还本付息纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率=（纳入政府性基金预算管理的资金/全部应纳入政府性基金预算管理的资金）×100%。	8	（7000 万/7000 万）*100%=100%。
管理 (70')	资金使用合规性 (20')	项目资金使用是否合规，是否按规定用途使用，是否符合规定的财务管理制度的文件规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的文件规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项债券投向的规定及项目有关规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。	20	①符合国家财经法规和财务管理制度的文件规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项债券投向的规定及项目有关规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用等情况。
	资金支出进度 (10')	资金支出进度情况（4 分）。 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况（6 分）。	资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%。	4	资金支出进度为 100%。
安全管理	安全管理合规		评价要点：按项目建设进度拨款情况。	6	按项目建设进度拨款。
			符合有关安全管理、疫情防控要求	10	

(10')	性					
		按计划还本付息执行情况 及项目年度收支平衡 情况等(16分)。	评价要点： ①是否严格执行还本 付息； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③项目是否实现年度收支平衡或项目全生命 周期预期收益与专项债券期限是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配。	①按专项债券本息偿还计划 还本付息； ②项目未到收益期（建设 期）；专项债券期限与项目期限 匹配。	22	财政部关于印发 《地方政府债券（试 行）》的通知（财 预〔2018〕209号） 规定，应当及时规 范披露专项债券 及其项目信息。
组织实施 (22')	项目实施规范 性	项目信息公开、信息系统 管理使用等专项债券项 目常态化情况（6 分）。	评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范 公开项目有关信息； ②信息系统管理使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及 时、有效整改； ④其他财务、采购和管理工作是 否合法合规。	符合规定（未到公开时间节 点）。		
合计						
					100	





项目现场照片

