

宣州区新增专项债宣城高新技术产业开 发区科技创新中心项目事中绩效评价

绩 效 评 价 报 告

委托单位：宣州区财政局

承接单位：江苏源合会计师事务所有限公司

二〇二二年六月三十日

目录

一、基本情况	4
(一) 项目概况	4
1. 项目背景	4
2. 项目内容	6
3. 实施情况	7
4. 资金投入及使用情况	7
(二) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
1. 目的	8
2. 对象及范围	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、 评价方法、评价标准等	8
1. 评价原则	9
2. 评价方法	9
3. 评价标准	9
4. 绩效评价体系	9
5. 绩效评价工作过程	10
三、评价结论及分析	11
四、绩效评价指标分析	13

(一) 项目决策情况	14
(二) 项目管理情况	14
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15
(一) 主要经验及做法	15
(二) 存在问题及原因分析	15
六、 下一步改进建议	16
七、 附件	17

宣州区新增专项债宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目事中绩效评价

宣州区财政局

受贵单位的委托，我们按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（皖财债〔2021〕1485号）、《安徽省财政厅关于进一步加强专项债绩效管理工作的通知》（皖财债〔2020〕1116号）、宣州区财政局《关于印发〈宣州区项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法〉的通知》（宣区财债）〔2020〕144号等法规、文件精神，对宣州区专项债宣城高新技术产业开发区科创中心项目进行了事中绩效评价，评价基准日为2022年4月30日。现评价工作已经结束，报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

安徽宣城高新技术产业开发区作为宣城市高新技术企业集聚园区，已形成新能源新材料、汽车装备制造、医药化工、农业等主导产业，主导产业和战略性新兴产业集聚效应突出。高新区被认定为市级新材料产业集聚发展宣州基地后，设立宣州科创服务中心专门用于科技企业孵化，但是随着入园孵化的科技企业激增，现有孵化器无法满足需求，迫切需要另行选址建设科创中心。该项目是一个有着良好社会效益的项目，既符合国家产业政策又符合专项债发行要求，同时又得到了宣州区有关部门大力支持，是一个专项债发展的好项目。

目前，随着地方疫情稳定，宣州区深入贯彻中央和省委决策部署，准确把握当前新冠肺炎疫情防控工作已进入新阶段，着力将防控优势转化为发展的先机，把经济发展从“暂停模式”转入“快进轨道”，做到疫情防控和复工复产“两手抓、两不误”。宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目作为高新区企业复工复产和重点建设项目提上日程，项目的建设将极大提升高新区的区域创新能力、产业竞争力、辐射带动力以及可持续发展能力、有助于高新技术产业的可持续性发展和产业创新转型、将有助于打造高新开发区品牌，提升宣州区形象，可以增强城市获取资源、配置资源和整合资源的能力，进而增强城市公共服务能力，提升城市竞争力，实现宣州区的全面协调可持续发展。

本项目本主管单位为安徽宣城高新技术产业开发区管委会，项目实施单位：宣城市晨兴建设投资有限公司，宣城市晨兴建设

投资有限公司成立于 2002 年 6 月 18 日，注册资本为 1004,500.00 万元，法人代表为徐平平，统一社会信用代码：91341802684995167T，经营范围：以自有资金对外投资（严禁非法融资）；市政工程建设、管理及服务；城镇化建设；安置房建设；生态农业项目和生态旅游项目的开发与经营；园林绿化工程、水利水电工程施工；标准化厂房代建；建材销售；保障性住房工程和棚户区改造项目开发及运营管理；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），项目具有良好的实施条件和保障。

2. 项目内容

本项目为宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目，项目性质属于新建项目，建设地点位于宣城市高新区南侧区域，南临叠翠东路，昭亭北路东侧，项目占地面积 95800.00 0f（约合 144 亩），规划总建筑面积 102763.48 m²，主要建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等，配套供配电、给排水、消防安全等附属工程。

项目建设期限为：2021 年 6 月-2023 年 2 月，预计 2023 年投入使用。

项目总投资为 52,954.96 万元，其中拟通过专项债筹措资金 35,000.00 万元。

根据实施方案显示：本项目收入主要来源于运营期产生的创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心和管理及其他服务用房销售收入以及出租收入和停车位出租收入，预期经营现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，项目可实现自求平衡。

3. 实施情况

本项目目前已完成了项目立项、勘察、初步设计方案、可行性研究、环境影响评价、用地、报批及施工图设计等前期实施准备工作，目前5号楼主体结构完成，地下室外墙结构施工完成，正在施工地下室结构顶板，项目目前正在按计划进行中。

4. 资金投入及使用情况

项目总投资为52,954.96万元，其中拟通过专项债筹措资金35,000.00万元，占总投资的66.09%，由政府统筹和单位自筹项目资本金17,954.96万元，占总投资的33.91%。

本次拟发行政府专项债券3.5亿元，分别于2021年发行政府专项债券1.5亿元，2022年发行政府专项债券2亿元；宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目2021年发行专项债券额度为15000万元，该项目为专项债券新增项目，本次申请2021年第7批专项债券新增额度为4000万元。截止2021年底，使用专项债资金4000万元，专项债资金到位率、使用率100%。

（二）项目绩效目标

1、本项目总体目标是在规划总建筑面积 102763.48 m²上，建设创新科技产品及绿色农产品研发展示交流中心、就业创业孵化及培训基地、文化体育活动中心、邻里服务中心、管理及其他服务用房、大门、门卫等，配套供配电、给排水、消防安全等附属工程，2022 年项目建设完成，2023 年实现项目正常运转。

2、近期目标：完成与计划投资相匹配的工程量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的

通过第三方开展的绩效评价，加强专项资金管理，客观、公正的检查 2021 年宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金项目绩效目标实现程度，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响，及时总结经验，分析县级预算支出项目在决策和执行中存在问题及原因，提出切实可行的意见和建议。

2. 对象及范围

本次绩效评价对象为宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目涉及 2021 年专项债资金 4000 万。范围包括项目：1、决策（项目立项、绩效目标、资金投入）；2、管理（预算管理、资金管理、资产管理、组织实施）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

(1) 相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据前期调研资料，本项目评价对象为宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目事中绩效评价，因此 本项目采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法。

3. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

4. 绩效评价体系

根据《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（皖财债〔2021〕1485号）文件要求，结合本项目特点共设置了2项一

级指标，7个二级指标，10个三级指标对2021年宣州区公开发行人工政府债券新增债券资金项目进行评价；评价体系涵盖项目决策、过程、两个方面，采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定4个评价等级。优（成效显著）：评价得分高于90分（含）；良（成效明显）：评价得分在80（含）-90分；中（成效一般）：评价得分在60（含）-80分；差（成效较差）：评价得分在60分以下。

5. 绩效评价工作过程

（1）评价人员组成

江苏源合会计师事务所有限公司委派具有丰富财政支出绩效评价工作经验的徐明担任项目负责人，同时抽调具有绩效评价工作经验的司法鉴定人、造价师、会计师等共5名专业人员组成评价工作组，负责本次绩效评价工作，以确保绩效评价工作客观、公正、严谨。评价人员组成名单详见下表：

姓名	执业资格或职称	备注
徐明	绩效评价师	
唐婷	会计师	
陈洪	会计师	
魏书星	二级造价师	

王尤优	司法鉴定人	
-----	-------	--

(2) 绩效评价过程

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、设计资料清单、评价方案论证与沟通等流程。

2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题等过程，最后在广泛征求意见的基础上、经三级复核后提交经委托人确认的评价报告。

三、评价结论及分析


根据 2021 年宣州区公开发行地方政府债券新增债券资金项目工作的实际情况，绩效评价工作组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。2021 年宣州区公开发行地方政府债券新增债券资金暨宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目项目综合评价得分 99 分，绩效级别为“优”。评分结果如下：

绩效评价得分表			
一级指标	二级指标	三级指标	最终得分
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	5
		立项程序规范性 (5')	5
	绩效目标 (10')	绩效目标合理性 (5')	5
		绩效指标明确性 (5')	5
	资金投入 (10')	申请额度与需要的匹配度	10
管理 (70')	预算管理 (8')	预算覆盖率	8
	资金管理 (30')	资金使用合规性 (20')	19.5
		资金支出进度 (10')	4
			6
	安全管理 (10')	安全管理合规性	9.5
	组织实施 (22')	项目实施规范性	22
合计			99

评价得分为 99 分、绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

宣州区公开发行人地方政府债券新增债券资金暨宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目,综合评价一级指标得分见下图、二级指标得分见下表:

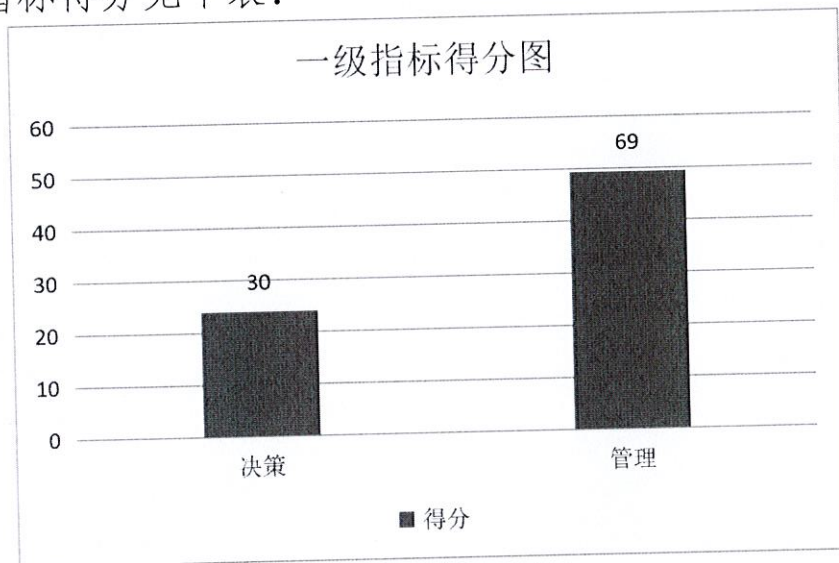

二级指标得分表		
一级指标	二级指标	最终得分
决策 (30')	项目立项 (10')	10
	绩效目标 (10')	10
	资金投入 (10')	10
管理 (70')	预算管理 (8')	8
	资金管理 (30')	29.5
	安全管理 (10')	9.5

	组织实施 (22')	22
	合计	99

(一) 项目决策情况

决策方面满分 30 分，评价得分 30 分。

1、其中项目立项满分 10 分，评价得分 10 分，项目立项程序规范，项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标满分 10 分，评价得分 10 分，制定绩效目标，其工作任务目标设定的合理、明确。

3、资金投入满分 10 分，评价得分 10 分。申请使用债券资金经过科学论证，申请额度与需要额度相匹配。

(二) 项目管理情况

管理方面满分 70 分，评价得分 69 分。

1、其中预算管理满分 8 分，评价得分 8 分，项目资金预算管理全额覆盖整个项目，专项债券支出全部纳入政府性基金预算管理，覆盖率为 100%。

2、资金管理方面满分 30 分，评价得分 30 分。其中资金使用合规性满分为 20 分，评价得分 19.5 分，部分资金的拨付审批手续不完整，其中 2021 年 11 月 17 日付中机工程有限公司工程款时，工程款支付审批表无落款日期，无法确定资金需求时间。资金支出进度方面满分为 10 分，评价得分 10 分，资金支出进度

100%，截止 2021 年底，2021 年专项债资金已全部支付。

3、安全管理方面满分 10 分，评价得分为 9.5 分。进入现场勘查时未要求进入人员登记、查验安康码、行程码，不符合疫情防控相关要求。

4、组织实施方面满分 22 分，评价得分 22 分，财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209 号）规定，应当及时规范披露专项债券及其项目信息。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、该项目位于宣城市高新区南侧区域，作为市级新材料产业集聚发展宣州基地，该项目完全符合重点支持的“两新”领域，盘活存量园区资产，补基础设施短板，很好地利用了专项债支持产业园区的建设。同时将帮助高新技术开发区将分散的相关产业资源集聚于一起。

2、为建设及推进本项目，当地政府和主管部门多次召开专题会议认真研究本项目，解决项目存在的问题，并把此工作列入年度工作责任目标进行督办考核，积极做好了项目的前期各项筹备工作。

（二）存在问题及原因分析

资金管理方面

在资金使用合规性上，部分资金支出的手续不完整，其中一笔工程款支付审批表无落款日期。主要原因是：资金的审批流程不严格规范。

项目管理方面

在安全管理上，现场勘查进入施工现场时未要求进入人员扫码登记、查验安康码、行程码；不符合施工现场疫情防控的相关要求。主要原因是：现场人员的安全管理不到位、疫情防控意识缺乏。

六、下一步改进建议

结合项目的总体目标及目前项目建设的进度情况，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的建议：

（一）项目实施方需加强财务管理，加强资金使用的规范性，严格资金审批环节管理，杜绝违规现象发生。同时保证资金按计划、按需求投入，产生应有的效益；加强成本控制和节约意识，提高资金使用率；全面推进预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

（二）完善项目管理机制，严格执行项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内。

（三）由于本项目工程复杂，涉及到的业态较多，对相关的安全防护措施需要进一步全面深入研究，生产运行当中所面临的卫生和卫生问题需不断加强，确保按期竣工验收交付使用，发挥效益。

（四）由于该项目有产权房需出售出租，科创企业入驻需招商，要提前谋划，确保建成交付投入使用无缝衔接，顺利实现项目预期收益。

七、附件

- 1、地方政府专项债券项目中期绩效评价指标体系
- 2、宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目中期绩效评价评分表
- 3、项目现场照片

江苏源合会计师事务所有限公司

二〇二二年六月三十日



附件一：

地方政府专项债券项目中期绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性 (5')	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ③项目立项、可研、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。
	绩效目标 (10')	绩效目标合理性 (5')	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (5')	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的明确细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入 (10')	申请额度与需要的匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务的匹配。

管理 (70')	预算管理 (8')	预算覆盖率	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率 = (纳入政府性基金预算资金管理资金 / 全部应纳入政府性基金预算资金管理资金) × 100%。
	资金管理 (30')	资金使用合规性 (20')	项目资金使用是否按规定用途使用, 是否符合相关的财务管理规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的文件规定; ② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③ 是否符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途; ④ 是否存在截留、挤占、挪用等情况。
		资金支出进度 (10')	资金支出进度情况。	资金支出进度 = (实际支出债券资金 / 项目债券资金总额) × 100%。
		资产支出进度 (10')	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	评价要点: 按项目建设进度拨款情况。
	资产管理 (10')	资产管理合规性	项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点: 是否按相关规定履行项目竣工后资产备案和产权登记。
	组织实施 (22')	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况、项目年度收支平衡情况等。 项目信息公开、信息系统管理使用等专项债券项目常态化管理情况。	评价要点: ① 是否严格按照有关规定及时、规范公开项目有关信息; ② 信息系统管理使用是否规范; ③ 对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改; ④ 其他财务、采购和管理工作是否合法合规。

附件二：

宣城高新技术产业开发区科技创新中心项目中期绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价依据	最终得分	备注
决策 (30')	项目立项 (10')	立项依据充分性 (5')	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②符合行业发展规划和政策要求； ③与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④属于政府投资项目，符合专项债券支持领域和方向； ⑤未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	
		立项程序规范性 (5')	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策； ③项目立项、可研、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。	①项目按照规定的程序申请设立； ②事前已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策； ③项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料符合要求。	5	
	绩效目标 (10')	绩效目标合理性 (5')	项目所设定的绩效目标是否依据充分，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与项目投资额或资金量相匹配。	5	

		绩效指标明确性 (5')	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的实现情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数相对应。	5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数相对应	
	资金投入 (10')	申请额度与需要的匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证,年度发行债券额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点: ①申请使用债券资金是否经过科学论证; ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否匹配; ③申请债券额度测算依据是否充分,是否按照标准测算; ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。	10	①申请使用债券资金经过科学论证; ②申请使用债券资金与项目性质、内容匹配; ③申请债券额度测算依据充分,按照标准测算; ④申请债券额度与工作任务相匹配。	
	预算管理 (8')	预算覆盖率	专项债券支出、还本付息纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率=(纳入政府性基金预算管理资金/全部应纳入政府性基金预算管理资金)×100%。	8	(4000万/4000万)*100% 专项债券支出全部纳入政府性基金预算管理。	
管理 (70')	资金使用 (30')	资金使用合规性 (20')	项目资金使用是否按相关规定用途使用,是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理的文件规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。	19.5	部分资金的拨付手续不完整。	对于2021年11月17日付中机工程有限公司工程款时,工程款支付审批表无落款日期。
		资金支出进度 (10')	资金支出进度情况 (4分)。	资金支出进度=(实际支出债券资金/项目债券资金总额)×100%。	4	(40000000/40000000)*100%	
			资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况 (6分)	评价要点:按项目建设进度拨款情况。	6	资金拨付与支出进度与项目建设进度相符。	

	安全管理性(10')	安全管理合理性	项目现场安全管理相关情况。	评价要点： ①是否符合施工现场安全管理相关要求； ②是否符合疫情防控相关要求；	施工现场疫情防控管理不到位。	9.5	进入现场勘查时未要求进入人员扫码登记、查验安康码及测量体温
组织实施性(22')	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况 及项目年度收支平衡 情况等（16分）。	评价要点： ①是否严格按照专项债券本息偿还计划还本付息； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③项目是否实收年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配。	①按专项债券本息偿还计划还本付息； ②项目未到收益期（处于建设期）； ③专项债券期限与项目期限匹配。	16		
		项目信息公开、信息系统管理使用等专项债券项目常态化情况（6分）。	评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ②信息系统管理使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。	符合规定（未到公开时间节点）。	6	财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）规定，应当及时规范披露专项债券及其项目信息。	
合计							



项目现场照片

